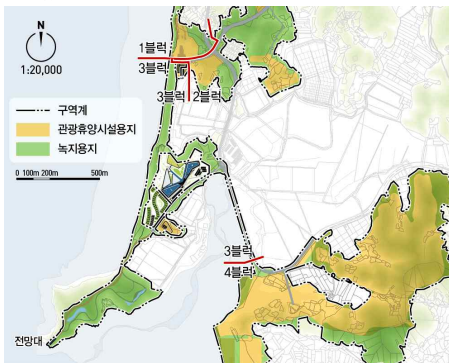
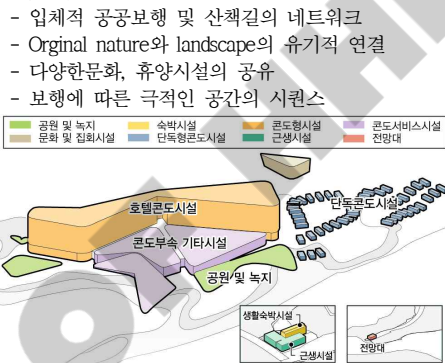
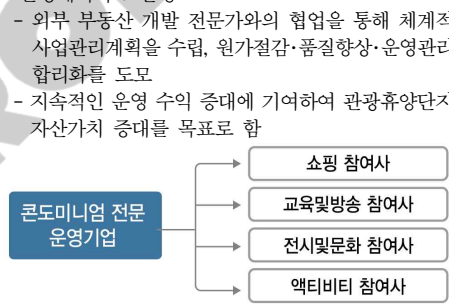


I. 재무능력분야

평가항목	평가요소	내용	Page																																																											
사업 신청자의 신용도	컨소시엄 구성원 중 출자비율 기준 상위 3개 업체 (의향기업)	• 사업진행은 컨소시엄이 아닌 단독으로 시행. • 컨소시엄 협정은 차후 인허가와 연계되어 진행예정. • 컨소시엄 협정서 없음. 금호리조트 금호건설 하나금융투자	P.22																																																											
	사업신청자의 재무현황	• 사업진행은 컨소시엄이 아닌 단독으로 시행. • 컨소시엄 협정은 차후 인허가와 연계되어 진행예정. • 의향기업의 상위 3개 업체의 최근 3개년 간 매출액 규모를 제출 단위 : 백만원 <table> <tr> <th></th><th>2015.12.31</th><th>2016.12.31</th><th>2017.12.31</th></tr> <tr> <td>금호리조트</td><td>82,966</td><td>88,943</td><td>86,369</td></tr> <tr> <td>금호건설</td><td>1,530,988</td><td>1,353,710</td><td>1,297,946</td></tr> <tr> <td>하나금융투자</td><td>2,894,860</td><td>2,678,824</td><td>3,355,315</td></tr> </table>		2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	금호리조트	82,966	88,943	86,369	금호건설	1,530,988	1,353,710	1,297,946	하나금융투자	2,894,860	2,678,824	3,355,315	P.31																																											
	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31																																																											
금호리조트	82,966	88,943	86,369																																																											
금호건설	1,530,988	1,353,710	1,297,946																																																											
하나금융투자	2,894,860	2,678,824	3,355,315																																																											
사업 신청자의 재무현황	자산규모컨소시엄 구성원 중 출자비율 기준 상위 3개 업체의 자산규모(의향기업)	• 사업진행은 컨소시엄이 아닌 단독으로 시행. • 컨소시엄 협정은 차후 인허가와 연계되어 진행예정. • 의향기업의 상위 3개 업체의 자산규모를 제출 2017.12.31 기준 단위 : 백만원 <table> <tr> <th>기업</th><th>자산규모</th></tr> <tr> <td>금호리조트</td><td>522,239</td></tr> <tr> <td>금호건설</td><td>1,284,876</td></tr> <tr> <td>하나금융투자</td><td>18,821,552</td></tr> </table>	기업	자산규모	금호리조트	522,239	금호건설	1,284,876	하나금융투자	18,821,552	P.40																																																			
	기업	자산규모																																																												
금호리조트	522,239																																																													
금호건설	1,284,876																																																													
하나금융투자	18,821,552																																																													
사업 신청자의 재무현황	컨소시엄 구성원 중 출자비율 기준 상위 3개 업체의 자기자본 규모	• 사업진행은 컨소시엄이 아닌 단독으로 시행. - kpih안면도의 자기자본 규모 및 장기적 자본확보 전략 <table> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th><th>2022년</th><th>2023년</th></tr> <tr> <td>자체자금</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>내부보유자금</td><td></td><td>3,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td></td><td>9,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>금융기관차입</td><td>130,000</td><td></td><td>100,000</td><td>30,000</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기타</td><td>575,841</td><td></td><td>21,191</td><td>114,478</td><td>215,711</td><td>224,460</td></tr> <tr> <td>합계</td><td>705,841</td><td>12,000</td><td>121,191</td><td>114,478</td><td>215,711</td><td>224,460</td></tr> </table>	구분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	자체자금							내부보유자금		3,000					기타		9,000					금융기관차입	130,000		100,000	30,000			기타	575,841		21,191	114,478	215,711	224,460	합계	705,841	12,000	121,191	114,478	215,711	224,460	P.40										
	구분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년																																																							
자체자금																																																														
내부보유자금		3,000																																																												
기타		9,000																																																												
금융기관차입	130,000		100,000	30,000																																																										
기타	575,841		21,191	114,478	215,711	224,460																																																								
합계	705,841	12,000	121,191	114,478	215,711	224,460																																																								
컨소시엄 구성원 중 출자비율 기준 상위 3개 업체의 영업현금흐름	• kpih안면도의 미래현금흐름 <table> <tr> <th>구분</th><th>계</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> <tr> <td>영업현금흐름</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>영업현금유입</td><td>575,841</td><td>21,191</td><td>114,478</td><td>215,711</td><td>224,460</td></tr> <tr> <td>영업현금유출</td><td>- 482,449</td><td>- 114,020</td><td>- 138,687</td><td>- 155,274</td><td>- 74,467</td></tr> <tr> <td>소계</td><td>93,392</td><td>- 92,829</td><td>- 24,209</td><td>60,437</td><td>149,993</td></tr> <tr> <td>재무현금흐름</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>차입금채입</td><td>130,000</td><td>100,000</td><td>30,000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>차입금상환</td><td>130,000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>130,000</td></tr> <tr> <td>소계</td><td>260,000</td><td>100,000</td><td>30,000</td><td>-</td><td>130,000</td></tr> <tr> <td>순현금흐름</td><td>353,392</td><td>7,171</td><td>5,791</td><td>60,437</td><td>279,993</td></tr> </table>	구분	계	2020	2021	2022	2023	영업현금흐름	-	-	-	-	-	영업현금유입	575,841	21,191	114,478	215,711	224,460	영업현금유출	- 482,449	- 114,020	- 138,687	- 155,274	- 74,467	소계	93,392	- 92,829	- 24,209	60,437	149,993	재무현금흐름	-	-	-	-	-	차입금채입	130,000	100,000	30,000	-	-	차입금상환	130,000	-	-	-	130,000	소계	260,000	100,000	30,000	-	130,000	순현금흐름	353,392	7,171	5,791	60,437	279,993	P.44
구분	계	2020	2021	2022	2023																																																									
영업현금흐름	-	-	-	-	-																																																									
영업현금유입	575,841	21,191	114,478	215,711	224,460																																																									
영업현금유출	- 482,449	- 114,020	- 138,687	- 155,274	- 74,467																																																									
소계	93,392	- 92,829	- 24,209	60,437	149,993																																																									
재무현금흐름	-	-	-	-	-																																																									
차입금채입	130,000	100,000	30,000	-	-																																																									
차입금상환	130,000	-	-	-	130,000																																																									
소계	260,000	100,000	30,000	-	130,000																																																									
순현금흐름	353,392	7,171	5,791	60,437	279,993																																																									

II. 사업계획분야

평가항목	평가요소	내용	Page																				
개발컨셉 및 계획의 적정성	상위계획과 관련법령의 적합성, 개발컨셉 및 개발기간의 적정성	• 관련법령의 적정성 지구단위계획과 건축법, 관광진흥법 등을 적용하였고 관련법령에 적합함 • 컨셉의 적정성  • 개발기간의 적정성 <table border="1"> <tr><td>2019. 5</td><td>우선사업자 통보 및 사업신청보증금 납부</td></tr> <tr><td>2019. 6</td><td>기본설계 및 지구단위변경 공사, 금융지원, 신탁사 협의/문화재 용역</td></tr> <tr><td>2019. 7</td><td>사업협약 체결</td></tr> <tr><td>2019. 8</td><td>문화재 용역 완료/실시설계 시작/금융사 기관공사 및 사전심의</td></tr> <tr><td>2019. 10</td><td>1차 투자이행 보증금 100억 납부/보증서</td></tr> <tr><td>2020. 1</td><td>실시설계 완료/공사자 도급 계약 체결/분양준비 및시작</td></tr> <tr><td>2020. 2</td><td>개발실시계획 심의/사업계획 심의/착공계 접수</td></tr> <tr><td>2020. 3</td><td>토지사용승낙서 수령/착공계 승인/자금조달 체결 및 대출/분양개시</td></tr> <tr><td>2020. 7</td><td>단지조성공사 착공</td></tr> <tr><td>2020. 12</td><td>단지조성공사 완료 / 사업진행</td></tr> </table>	2019. 5	우선사업자 통보 및 사업신청보증금 납부	2019. 6	기본설계 및 지구단위변경 공사, 금융지원, 신탁사 협의/문화재 용역	2019. 7	사업협약 체결	2019. 8	문화재 용역 완료/실시설계 시작/금융사 기관공사 및 사전심의	2019. 10	1차 투자이행 보증금 100억 납부/보증서	2020. 1	실시설계 완료/공사자 도급 계약 체결/분양준비 및시작	2020. 2	개발실시계획 심의/사업계획 심의/착공계 접수	2020. 3	토지사용승낙서 수령/착공계 승인/자금조달 체결 및 대출/분양개시	2020. 7	단지조성공사 착공	2020. 12	단지조성공사 완료 / 사업진행	P.5 P.16
2019. 5	우선사업자 통보 및 사업신청보증금 납부																						
2019. 6	기본설계 및 지구단위변경 공사, 금융지원, 신탁사 협의/문화재 용역																						
2019. 7	사업협약 체결																						
2019. 8	문화재 용역 완료/실시설계 시작/금융사 기관공사 및 사전심의																						
2019. 10	1차 투자이행 보증금 100억 납부/보증서																						
2020. 1	실시설계 완료/공사자 도급 계약 체결/분양준비 및시작																						
2020. 2	개발실시계획 심의/사업계획 심의/착공계 접수																						
2020. 3	토지사용승낙서 수령/착공계 승인/자금조달 체결 및 대출/분양개시																						
2020. 7	단지조성공사 착공																						
2020. 12	단지조성공사 완료 / 사업진행																						
시설계획 및 토지이용 계획의 적정성	시설계획, 배치계획 및 토지이용계획의 적정성	• 종합개발구상도  • 마스터플랜 - 입체적 공공보행 및 산책길의 네트워크 - Original nature와 landscape의 유기적 연결 - 다양한문화, 휴양시설의 공유 - 보행에 따른 극적인 공간의 시퀀스 	P.26																				
친환경적 개발 및 보존계획 수립	친환경 개발 및 복원 계획의 적정성	• 친환경 개발의 적정성  • 복원계획의 적정성 안면도의 자연환경을 훼손을 최소화하기 위해 시작단계부터 구체적인 관리계획과 환경오염방지 계획을 세운다. <table border="1"> <thead> <tr> <th>관리계획</th><th>환경오염방지계획</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> - 입지단계 - 개발사업시행으로 인한 영향예측, 평가 및 대책 - 개발사업 및 해당대상 부지조사 특성조사 - 개발사업의 특성상 따른 해당대상 부지의 적정성 검토 - 기본설계 단계 - 환경정책적 설계에 위한 세부대책 - 시공단계 - 건설공사 시 자연환경 보호 - 인면제에 의한 조치 - 유지관리 단계 - 환경정책적 운영 및 관리 - 해제 및 평가 시 자연환경 보호 - 인면제 운영을 위한 조치 </td><td> - 기상 및 대기 환경오염방지계획 - 토양, 지형 및 토지이용 환경오염방지계획 - 동식물상 환경오염방지계획 - 물순환(우수처리 등) 환경오염방지계획 - 소음·진동 환경오염방지계획 - 폐기물 환경오염방지계획 </td></tr> </tbody> </table>	관리계획	환경오염방지계획	- 입지단계 - 개발사업시행으로 인한 영향예측, 평가 및 대책 - 개발사업 및 해당대상 부지조사 특성조사 - 개발사업의 특성상 따른 해당대상 부지의 적정성 검토 - 기본설계 단계 - 환경정책적 설계에 위한 세부대책 - 시공단계 - 건설공사 시 자연환경 보호 - 인면제에 의한 조치 - 유지관리 단계 - 환경정책적 운영 및 관리 - 해제 및 평가 시 자연환경 보호 - 인면제 운영을 위한 조치	- 기상 및 대기 환경오염방지계획 - 토양, 지형 및 토지이용 환경오염방지계획 - 동식물상 환경오염방지계획 - 물순환(우수처리 등) 환경오염방지계획 - 소음·진동 환경오염방지계획 - 폐기물 환경오염방지계획	P.70																
관리계획	환경오염방지계획																						
- 입지단계 - 개발사업시행으로 인한 영향예측, 평가 및 대책 - 개발사업 및 해당대상 부지조사 특성조사 - 개발사업의 특성상 따른 해당대상 부지의 적정성 검토 - 기본설계 단계 - 환경정책적 설계에 위한 세부대책 - 시공단계 - 건설공사 시 자연환경 보호 - 인면제에 의한 조치 - 유지관리 단계 - 환경정책적 운영 및 관리 - 해제 및 평가 시 자연환경 보호 - 인면제 운영을 위한 조치	- 기상 및 대기 환경오염방지계획 - 토양, 지형 및 토지이용 환경오염방지계획 - 동식물상 환경오염방지계획 - 물순환(우수처리 등) 환경오염방지계획 - 소음·진동 환경오염방지계획 - 폐기물 환경오염방지계획																						
운영계획의 적정성	운영계획의 효율성 및 운영주체, 도입시설 추정 손익분석, 시설별 운영방법, 관광객 유치방안 등	• 운영계획의 효율성 - 외부 부동산 개발 전문가와의 협업을 통해 체계적 사업관리계획을 수립, 원가절감·품질향상·운영관리 합리화를 도모 - 지속적인 운영 수익 증대에 기여하여 관광휴양단지 자산가치 증대를 목표로 함  • 도입시설 추정 - 전시영역, 스포츠영역, 콘도 및 쇼핑 영역, 교육영역 등 공간의성격으로 도입시설 추정가능	P.80																				
지역사회 발전 기여방안	지역경제 기여 및 주민친화 계획	• 충청남도 대표 관광지 꽃지해수욕장 안면도는 월 34,979명 ~ 108,668명의 방문객이 있고, 매월은 약1994,800원에서 5597,900원월대로 여름과 겨울의 매출은 비슷하며 충청남도 전체에서 상위권을 유지하고 있지만 부족한 숙박시설과 불리한 접근성(교통편면)에 성장에 제약을 받고 있어 개발이 시급한 실정임에 따라 관광의 대중화를 위한 대책마련과 인접(2021년) 개발이 되면 보행과 안면도안 이동을 약10분으로 단축하여 개발이제 대규 도입시설의 장점을 최대한 활용하여 충청남도의 다양한 휴식보행도 휴식처를 유지 또는 연계하여 이진 꽃지해수욕장이 가지지 못해, 부족한 다양한 프로그램들을 통해 방문객이 증가하여 따른 매출도 증가하여 지역경제 활성화 • 주민친화계획 본 개발사업을 통해 만들어질 대규모 콘도는 충청남도의 다양한 이면(문화)수용이 가능하게 됨으로서 다양한 휴식처를 만들어 지역과 다양한 자연을 활용하고 지역민들에게는 편의성을 통해 협업을 지원하여 지역경제발전에 기여 보행(트레크) / 물놀이(수영) / 연꽃축제 / 바다낚시대회 / 지역별 축제 / 수상스포츠 / 대하축제 등을 통한 다양한 상품개발 • 지역민 최우선 채용 년간 약 400여명의 고용충실이 예상 되나 비정규직을 가진 인력이 50%이상 상충기대 • 부가가치유발 관광소비 욕구 다양화에 따른 여행객들은 충청남도가 재고 되고 있는 자연자원, 문화자원, 인공자원 등 관광 입장에서 다양한 여행(트레킹 및 레저, 휴양시설, 전시·아트존, 문화, 생활체험 등)을 제공하는 충청남도의 랜드마크가 되어 수도권과 인근도(서울)에 유입되는 관광객으로 인한 새로운 부가가치 창출 효과 - 사적인 관광은 급속히 되고 있는 고용화시대로서의 가족단위 휴양시설을 기반으로 일어나는 가족 휴양의 하나로, 가장안정한 물놀이 시설로 다양한 프로그램 자체가 관광 상품이 된다. - 안면도관광은 지역 경제의 새로운 소득과 고용을 창출하고, 지역경제를 개선하는 효과가 있다. - 또 관광과 직·간접적으로 관련된 기업(호텔·숙박)의 개인(수용)을 위한 보행하는 관광 상품 유입을 통해 안면도 인근 지역으로 지역사회 발전에 기여하여 충청남도 관광 활성의 최우선 과제인 것으로 기대된다. 안면도 관광지 잠재효과와 기여도와 함께 고용창출	P.92																				

II. 투자계획분야

평가항목	평가요소	내용	Page																																																																																																																																																																																																																																				
재원조달 계획의 적정성	개발계획과 재원조달 방법의 연계 구체성 및 국내외(외국인투자기업 등) 재원조달과 자기자본 투자계획	개발계획과 재원조달방법의 연계 구체성 연차별 재원조달계획 <table><thead><tr><th>구분</th><th>계</th><th>2019년</th><th>2020년</th><th>2021년</th><th>2022년</th><th>2023년</th></tr></thead><tbody><tr><td>자기자본</td><td></td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>타인자본 (하나금융투자)</td><td>1,300</td><td>-</td><td>1,000</td><td>300</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>분양대금 등 기타 필요항목</td><td>5,848</td><td>90</td><td>211</td><td>1,144</td><td>2,157</td><td>2,244</td></tr><tr><td>합계</td><td>7,178</td><td>120</td><td>121,191</td><td>1,444</td><td>2,157</td><td>2,244</td></tr></tbody></table> 국내외 재원조달과 자기자본 투자계획 타인자본 조달계획 다양한 구조금융 및 조달수단의 검토결과 여러 금융기관이 참여하는 비소구 또는 제한적소구(None-Recourse of Limited-Recourse)형식의 프로젝트파이낸싱(Project Financing) 형태의 국내 금융기관 등을 통한 원화 신디케이트 대출 타인자본 조달을 계획함. <table><thead><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr></thead><tbody><tr><td>차입형태</td><td>비소구 또는 제한적 소구 조건의 프로젝트 파이낸싱</td></tr><tr><td>차입수단</td><td>국내 신디케이트 대출</td></tr><tr><td>차입액</td><td>3,000억원 내외</td></tr><tr><td>차입기간</td><td>최초차입일로부터 36개월</td></tr><tr><td>예상금리</td><td>5.5% (세부금리는 금융협상을 통해 결정 예정)</td></tr><tr><td>이자지급방법</td><td>매월 지급</td></tr><tr><td>상환방식</td><td>분양대금 및 선 매각 대금으로 분할 상환</td></tr><tr><td>주선기관</td><td>하나금융투자</td></tr></tbody></table> 자기자본 투입계획 (단위 : 억원) (단위 : 억원) <table><thead><tr><th>구분</th><th>계</th><th>-</th><th>2020년</th><th>2021년</th><th>2022년</th><th>2023년</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. 자체자금</td><td>120</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>내부보유자금</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>증자</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기타</td><td>90</td><td>90</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. 타인자금</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>회사채발행</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>금융기관차입</td><td>1,300</td><td>-</td><td>1,000</td><td>300</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기타</td><td>5,758</td><td>-</td><td>211</td><td>1,144</td><td>2,157</td><td>2,244</td></tr><tr><td>합계</td><td>7,178</td><td>120</td><td>1,211</td><td>1,444</td><td>2,157</td><td>2,244</td></tr></tbody></table>	구분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	자기자본		30	-	-	-	-	타인자본 (하나금융투자)	1,300	-	1,000	300	-	-	분양대금 등 기타 필요항목	5,848	90	211	1,144	2,157	2,244	합계	7,178	120	121,191	1,444	2,157	2,244	구분	내용	차입형태	비소구 또는 제한적 소구 조건의 프로젝트 파이낸싱	차입수단	국내 신디케이트 대출	차입액	3,000억원 내외	차입기간	최초차입일로부터 36개월	예상금리	5.5% (세부금리는 금융협상을 통해 결정 예정)	이자지급방법	매월 지급	상환방식	분양대금 및 선 매각 대금으로 분할 상환	주선기관	하나금융투자	구분	계	-	2020년	2021년	2022년	2023년	1. 자체자금	120	-	-	-	-	-	내부보유자금	30	30	-	-	-	-	증자	-	-	-	-	-	-	기타	90	90	-	-	-	-	2. 타인자금	-	-	-	-	-	-	회사채발행	-	-	-	-	-	-	금융기관차입	1,300	-	1,000	300	-	-	기타	5,758	-	211	1,144	2,157	2,244	합계	7,178	120	1,211	1,444	2,157	2,244	P.1																																																																																																									
		구분	계	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년																																																																																																																																																																																																																															
자기자본		30	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
타인자본 (하나금융투자)	1,300	-	1,000	300	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
분양대금 등 기타 필요항목	5,848	90	211	1,144	2,157	2,244																																																																																																																																																																																																																																	
합계	7,178	120	121,191	1,444	2,157	2,244																																																																																																																																																																																																																																	
구분	내용																																																																																																																																																																																																																																						
차입형태	비소구 또는 제한적 소구 조건의 프로젝트 파이낸싱																																																																																																																																																																																																																																						
차입수단	국내 신디케이트 대출																																																																																																																																																																																																																																						
차입액	3,000억원 내외																																																																																																																																																																																																																																						
차입기간	최초차입일로부터 36개월																																																																																																																																																																																																																																						
예상금리	5.5% (세부금리는 금융협상을 통해 결정 예정)																																																																																																																																																																																																																																						
이자지급방법	매월 지급																																																																																																																																																																																																																																						
상환방식	분양대금 및 선 매각 대금으로 분할 상환																																																																																																																																																																																																																																						
주선기관	하나금융투자																																																																																																																																																																																																																																						
구분	계	-	2020년	2021년	2022년	2023년																																																																																																																																																																																																																																	
1. 자체자금	120	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
내부보유자금	30	30	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
증자	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
기타	90	90	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
2. 타인자금	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
회사채발행	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
금융기관차입	1,300	-	1,000	300	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
기타	5,758	-	211	1,144	2,157	2,244																																																																																																																																																																																																																																	
합계	7,178	120	1,211	1,444	2,157	2,244																																																																																																																																																																																																																																	
사업성 분석의 현실성 및 타당성	사업성 분석의 현실성 및 타당성	시장조사 국내관광 트렌드 인터넷과 모바일의 영향으로 방송을 포함하여 다양한 여행 콘텐츠의 확대·재생산 단순 관광을 넘어, 직접 체험하고 맛보고 경험하는 여행의 시대가 도래 국내 관광객 동향 국내여행 참가가 점차 증가하는 추세로 전체 여행시장 규모도 커지고 있음 숙박여행 일수는 거의 변화가 없으며 다양한 숙박시설의 출현에도 가족/친지집의 이용율이 여전히 50% 내외의 강세를 보임 외래관광객 트렌드 전반적으로 재방문을 및 체재기간은 증가하나 평균 소비하는 금액은 감소하는 추세임 쇼핑은 감소하고, 음식 및 미식관광의 수요는 증가하는 것으로 나타남 외래 관광객 동향 2013년 외래 관광객 1,000만명을 돌파한 이래 꾸준히 증가하고 있으나, 중국과의 대외관계의 영향을 받으면 감소하는 경향을 보임 국가별로는 중국이 꾸준히 1위를 유지하고, 다음으로 일본, 대만, 미국 순으로 나타남 수요 분석을 통한 제안 트렌드 분석을 통해 시설이용의 주 타겟층 변화 파악 방문 동향 및 수요추이를 통한 숙박시설의 사업적 활성화 전략 필요 3지구 써사이드의 지정용도 콘도미니엄의 한계성 인식연도별 총사업비 산정 연도별 총사업비 산정 <table><thead><tr><th>구분</th><th>총사업비</th><th>2020년</th><th>2021년</th><th>2022년</th><th>2023년</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.토지관련</td><td>소계</td><td>29,479</td><td>29,479</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>매각대금</td><td>29,479</td><td>29,479</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2.직접공사비</td><td>소계</td><td>306,582</td><td>27,562</td><td>108,223</td><td>125,208</td><td>45,589</td></tr><tr><td></td><td>건축공사비</td><td>202,344</td><td>18,191</td><td>71,427</td><td>82,637</td><td>30,089</td></tr><tr><td></td><td>토목및/환경공사비</td><td>9,197</td><td>827</td><td>3,247</td><td>3,756</td><td>1,368</td></tr><tr><td></td><td>조경공사비</td><td>3,066</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3,066</td></tr><tr><td></td><td>전기통신공사비</td><td>39,856</td><td>3,583</td><td>14,069</td><td>16,277</td><td>5,927</td></tr><tr><td></td><td>설비공사비</td><td>52,119</td><td>4,685</td><td>18,398</td><td>21,285</td><td>7,750</td></tr><tr><td>3.간접공사비</td><td>소계</td><td>55,389</td><td>15,693</td><td>6,686</td><td>11,583</td><td>21,427</td></tr><tr><td></td><td>상물개발비</td><td>12,616</td><td>11,951</td><td>-</td><td>-</td><td>664</td></tr><tr><td></td><td>설계비</td><td>8,176</td><td>2,402</td><td>2,708</td><td>1,277</td><td>1,788</td></tr><tr><td></td><td>감리비</td><td>9,733</td><td>200</td><td>300</td><td>-</td><td>9,233</td></tr><tr><td></td><td>취득료</td><td>2,880</td><td>640</td><td>960</td><td>960</td><td>320</td></tr><tr><td></td><td>인허가외 예비비</td><td>20,985</td><td>-</td><td>2,218</td><td>9,346</td><td>9,421</td></tr><tr><td></td><td>예비비</td><td>1,000</td><td>500</td><td>500</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>4.일반관리비</td><td>소계</td><td>71,201</td><td>35,701</td><td>18,340</td><td>12,633</td><td>4,527</td></tr><tr><td></td><td>홍보비</td><td>18,098</td><td>14,478</td><td>3,620</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>판매비</td><td>51,636</td><td>20,644</td><td>14,465</td><td>12,603</td><td>3,924</td></tr><tr><td></td><td>기타부대비</td><td>1,467</td><td>579</td><td>255</td><td>30</td><td>603</td></tr><tr><td>5.금융비</td><td>소계</td><td>19,798</td><td>5,585</td><td>5,550</td><td>8,288</td><td>27,598</td></tr><tr><td></td><td>금융비</td><td>19,798</td><td>5,585</td><td>5,550</td><td>8,288</td><td>27,598</td></tr><tr><td>총계</td><td></td><td>482,448</td><td>114,020</td><td>138,799</td><td>157,712</td><td>99,140</td></tr></tbody></table> 사업비 분석 토지 관련 비용 총비용 (토지비+기타비용) : 29,479,022 천만원 사업토지 가격 : 27,972,296 천원 <table><thead><tr><th>필지번호</th><th>면적</th><th>단가</th><th>예정가격</th><th>용도지역</th><th>비고</th></tr></thead><tbody><tr><td>제3지구</td><td>249,924㎡ (75,602평)</td><td>37만원</td><td>27,972,296</td><td>숙박시설 (콘도미니엄)</td><td>태안군 중정리 산14-251번지 인근</td></tr></tbody></table> 기타비용 : 1,506,726 천원 <table><thead><tr><th>구분</th><th>사업비 (천원)</th></tr></thead><tbody><tr><td>재산세/종부세</td><td>1,286,726</td></tr><tr><td>기타비용</td><td>220,000</td></tr><tr><td>합계</td><td>1,506,726</td></tr></tbody></table> 일반 사업비 사업비 : 452,969,609 천원 <table><thead><tr><th>구분</th><th>계</th><th>구분</th><th>계</th></tr></thead><tbody><tr><td>공사비, 설계비등</td><td>327,373,004</td><td>신락수수료 (관리형토지신탁)</td><td>500,000</td></tr><tr><td>분양보증수수료</td><td>1,515,955</td><td>입주관리비</td><td>602,500</td></tr><tr><td>건립비</td><td>1,375,000</td><td>민원처리비</td><td>274,210</td></tr><tr><td>임차료</td><td>1,188,000</td><td>소송비용 등 법무비</td><td>-</td></tr><tr><td>DP/모형</td><td>660,000</td><td>시행사 운영비</td><td>1,800,000</td></tr><tr><td>운영비</td><td>1,080,000</td><td>회계감사비용(시행사)</td><td>90,000</td></tr><tr><td>광고홍보비</td><td>18,097,845</td><td>예비비</td><td>1,000,000</td></tr><tr><td>분양촉진비</td><td>20,985,247</td><td>금융비용</td><td>19,797,500</td></tr><tr><td>숙박시설-콘도(수수료)</td><td>37,246,726</td><td>분양촉진비</td><td>20,985</td></tr><tr><td>숙박시설-단독(수수료)</td><td>9,650,331</td><td>합계</td><td>452,969,609</td></tr><tr><td>관련부담금</td><td>9,733</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 총계 (토지비+토지관련비용+사업비) = 482,448백만원 리스크 대책 및 공사완공 보증방안 과확적 분석 리스크 예측 및 대비 개발 및 운영 강구 책임분담 직접 임대/운영 사업리스크 최소화 / 비활성화 리스크 상쇄 투자주 출장년도 KPIH 인연도 PF 금융 (약 3,000억원) 사전 임대 및 분양 (CI&O+) 시공사 책임준공 PF 금융 PF 대출 (준공 후 담보대출) 신사 책임분담 관리 시공사 책임준공 (공사 기성 별) PF 금융 PF 대출 (준공 후 담보대출)	구분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고	1.토지관련	소계	29,479	29,479	-	-	-		매각대금	29,479	29,479	-	-	-	2.직접공사비	소계	306,582	27,562	108,223	125,208	45,589		건축공사비	202,344	18,191	71,427	82,637	30,089		토목및/환경공사비	9,197	827	3,247	3,756	1,368		조경공사비	3,066	-	-	-	3,066		전기통신공사비	39,856	3,583	14,069	16,277	5,927		설비공사비	52,119	4,685	18,398	21,285	7,750	3.간접공사비	소계	55,389	15,693	6,686	11,583	21,427		상물개발비	12,616	11,951	-	-	664		설계비	8,176	2,402	2,708	1,277	1,788		감리비	9,733	200	300	-	9,233		취득료	2,880	640	960	960	320		인허가외 예비비	20,985	-	2,218	9,346	9,421		예비비	1,000	500	500	-	-	4.일반관리비	소계	71,201	35,701	18,340	12,633	4,527		홍보비	18,098	14,478	3,620	-	-		판매비	51,636	20,644	14,465	12,603	3,924		기타부대비	1,467	579	255	30	603	5.금융비	소계	19,798	5,585	5,550	8,288	27,598		금융비	19,798	5,585	5,550	8,288	27,598	총계		482,448	114,020	138,799	157,712	99,140	필지번호	면적	단가	예정가격	용도지역	비고	제3지구	249,924㎡ (75,602평)	37만원	27,972,296	숙박시설 (콘도미니엄)	태안군 중정리 산14-251번지 인근	구분	사업비 (천원)	재산세/종부세	1,286,726	기타비용	220,000	합계	1,506,726	구분	계	구분	계	공사비, 설계비등	327,373,004	신락수수료 (관리형토지신탁)	500,000	분양보증수수료	1,515,955	입주관리비	602,500	건립비	1,375,000	민원처리비	274,210	임차료	1,188,000	소송비용 등 법무비	-	DP/모형	660,000	시행사 운영비	1,800,000	운영비	1,080,000	회계감사비용(시행사)	90,000	광고홍보비	18,097,845	예비비	1,000,000	분양촉진비	20,985,247	금융비용	19,797,500	숙박시설-콘도(수수료)	37,246,726	분양촉진비	20,985	숙박시설-단독(수수료)	9,650,331	합계	452,969,609	관련부담금	9,733		
구분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	비고																																																																																																																																																																																																																																	
1.토지관련	소계	29,479	29,479	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
	매각대금	29,479	29,479	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
2.직접공사비	소계	306,582	27,562	108,223	125,208	45,589																																																																																																																																																																																																																																	
	건축공사비	202,344	18,191	71,427	82,637	30,089																																																																																																																																																																																																																																	
	토목및/환경공사비	9,197	827	3,247	3,756	1,368																																																																																																																																																																																																																																	
	조경공사비	3,066	-	-	-	3,066																																																																																																																																																																																																																																	
	전기통신공사비	39,856	3,583	14,069	16,277	5,927																																																																																																																																																																																																																																	
	설비공사비	52,119	4,685	18,398	21,285	7,750																																																																																																																																																																																																																																	
3.간접공사비	소계	55,389	15,693	6,686	11,583	21,427																																																																																																																																																																																																																																	
	상물개발비	12,616	11,951	-	-	664																																																																																																																																																																																																																																	
	설계비	8,176	2,402	2,708	1,277	1,788																																																																																																																																																																																																																																	
	감리비	9,733	200	300	-	9,233																																																																																																																																																																																																																																	
	취득료	2,880	640	960	960	320																																																																																																																																																																																																																																	
	인허가외 예비비	20,985	-	2,218	9,346	9,421																																																																																																																																																																																																																																	
	예비비	1,000	500	500	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
4.일반관리비	소계	71,201	35,701	18,340	12,633	4,527																																																																																																																																																																																																																																	
	홍보비	18,098	14,478	3,620	-	-																																																																																																																																																																																																																																	
	판매비	51,636	20,644	14,465	12,603	3,924																																																																																																																																																																																																																																	
	기타부대비	1,467	579	255	30	603																																																																																																																																																																																																																																	
5.금융비	소계	19,798	5,585	5,550	8,288	27,598																																																																																																																																																																																																																																	
	금융비	19,798	5,585	5,550	8,288	27,598																																																																																																																																																																																																																																	
총계		482,448	114,020	138,799	157,712	99,140																																																																																																																																																																																																																																	
필지번호	면적	단가	예정가격	용도지역	비고																																																																																																																																																																																																																																		
제3지구	249,924㎡ (75,602평)	37만원	27,972,296	숙박시설 (콘도미니엄)	태안군 중정리 산14-251번지 인근																																																																																																																																																																																																																																		
구분	사업비 (천원)																																																																																																																																																																																																																																						
재산세/종부세	1,286,726																																																																																																																																																																																																																																						
기타비용	220,000																																																																																																																																																																																																																																						
합계	1,506,726																																																																																																																																																																																																																																						
구분	계	구분	계																																																																																																																																																																																																																																				
공사비, 설계비등	327,373,004	신락수수료 (관리형토지신탁)	500,000																																																																																																																																																																																																																																				
분양보증수수료	1,515,955	입주관리비	602,500																																																																																																																																																																																																																																				
건립비	1,375,000	민원처리비	274,210																																																																																																																																																																																																																																				
임차료	1,188,000	소송비용 등 법무비	-																																																																																																																																																																																																																																				
DP/모형	660,000	시행사 운영비	1,800,000																																																																																																																																																																																																																																				
운영비	1,080,000	회계감사비용(시행사)	90,000																																																																																																																																																																																																																																				
광고홍보비	18,097,845	예비비	1,000,000																																																																																																																																																																																																																																				
분양촉진비	20,985,247	금융비용	19,797,500																																																																																																																																																																																																																																				
숙박시설-콘도(수수료)	37,246,726	분양촉진비	20,985																																																																																																																																																																																																																																				
숙박시설-단독(수수료)	9,650,331	합계	452,969,609																																																																																																																																																																																																																																				
관련부담금	9,733																																																																																																																																																																																																																																						
